ગુલાલ · જંબુસર · ભરૂચ

શ્રી ભગવતી માતાજી મંદિર

Shri Bhagwati Mataji Mandir

આવનારી પેઢી માટેનું મંદિર

A temple for the next generation

કપિલ બ્રાહ્મણ સમાજ, કાવી · Discussion edition · 1 Nov 2026



01 · આજે · TODAY

આજનું આપણું મંદિર

Our temple today, in real photographs



ઓસરી અને પગથિયાં
Porch, steps and shed



છાંયડો, બાંકડા અને ખેતર
Shade, benches, open fields



પરિવાર માતાજીના આંગણે
Family at Mataji's doorstep

> **પેઢીઓથી આપણા પરિવારોને જોડતું સ્થાન. હવે ઇમારતને સંભાળની જરૂર છે.**
> For generations this place has held our families together. Now the building needs care.

Real photos of the existing temple · Original full-size photos and a 360° video are still to be collected

02 · વારસો · HERITAGE

આપણો વારસો, સાચી રીતે

Heritage, carefully told

દસ્તાવેજી ઇતિહાસ
Documented

1876ના "Inscriptions from Kavi" લેખમાં કાવીના કપિલ બ્રાહ્મણોના ભટ્ટોનો ઉલ્લેખ છે.
An 1876 article records the Bhattas of the Kapila Brahmans at Kavi.

સમાજની સમજ
Community belief

ગુલાલના ભગવતી માતાજી આપણાં કુળદેવી છે.
Bhagwati Mataji of Gulal is our Kuldevi, within the Kapil Brahmin Samaj, Kavi.


હજુ પુરાવો નથી
Not yet known


સ્થાપના તારીખ, મૂળ બાંધનાર, જૂના ફેરફાર.
Founding date, original builder, past renovations. Ask elders; record it honestly.

દંતકથા ઘડવી નથી. માતાજી અને પરિવારોનો જીવંત સંબંધ પૂરતો છે.

We will not invent a legend. The living bond between Mataji and our families is enough.

Source: G. Bühler, "Inscriptions from Kâvî", The Indian Antiquary 5 (April 1876), p. 109. It does not date the Gulal temple.

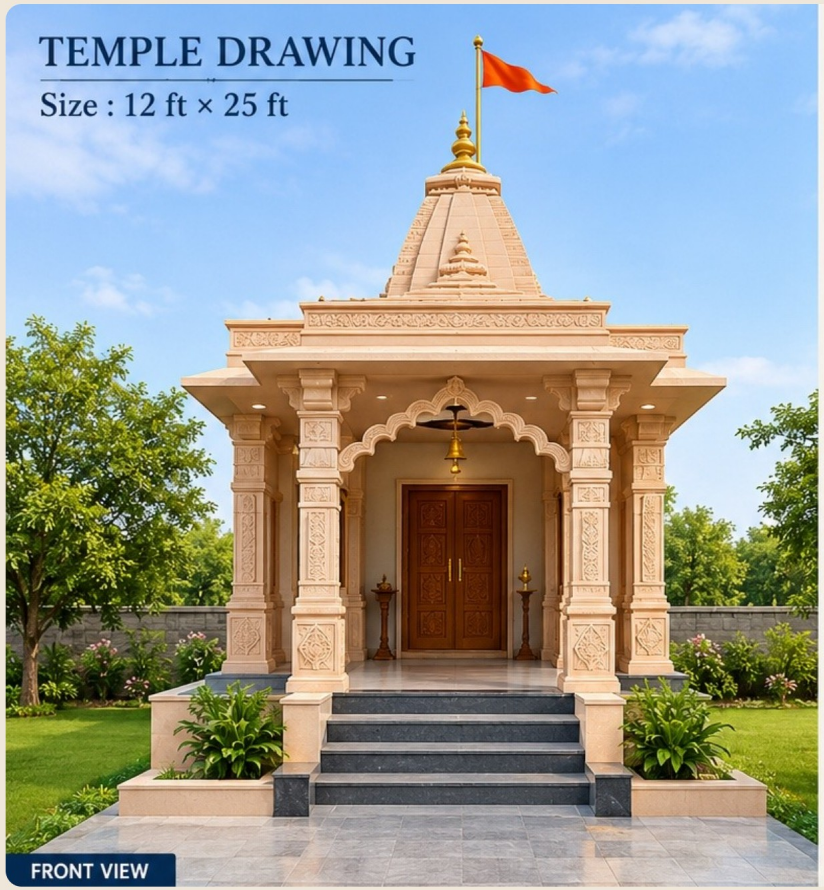

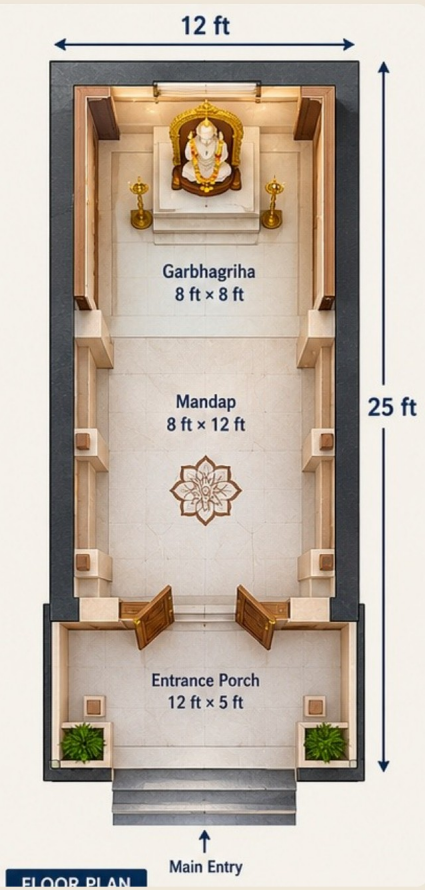

પિતાજીનું સપનું

Father's drawing, our starting point

ભાગ · Part	માપ · Size
આખું મંદિર · Overall	12 × 25 ft
ગર્ભગૃહ · Sanctum	8 × 8 ft
મંડપ · Mandap	8 × 12 ft
ઓસરી · Porch	12 × 5 ft
ઊંચાઈ · Height	~15 ft

ચિત્રમાંની મૂર્તિ પ્રતીક છે, આપણી માતાજીની મૂર્તિ નથી.
The idol in the drawing is symbolic, not our Mataji's murti.

04 · સુધારા · CORRECTIONS

ચિત્રને બાંધી શકાય તેવું બનાવવા ચાર સુધારા

Four corrections to make the drawing buildable

1 **દીવાલની જાડાઈ · Wall thickness**

8 + 12 + 5 = 25 ft, દીવાલ માટે જગ્યા નથી.

Room depths use all 25 ft, leaving nothing for walls.

2 **શિખરની ઊંચાઈ · Height**

15 ft માં શિખર સમાય નહીં; આશરે 22–26 ft.

15 ft cannot hold a shikhar; plan about 22–26 ft to the kalash.

3 **ઓટલો અને ઢાળ · Plinth and ramp**

3 પગથિયાં રાખીએ તો ઢાળ આશરે 21 ft, બાજુમાં.

With 3 steps, a 1:12 ramp is about 21 ft, run along the side.

4 **પ્રદક્ષિણા અને ગૌમુખ · Parikrama**

ચારે બાજુ 5 ft રસ્તો; અભિષેકના પાણીની નીક.

A 5 ft path all round, and an outlet for abhishek water.

Indicative only · Final sizes by a registered engineer and a Sompura, after the survey

05 · સુધારેલો નકશો · CORRECTED PLAN

એ જ 12 × 25 ft, દીવાલો સાથે

The same 12 × 25 ft footprint, with real walls

← પાછળ · Rear

આગળ · Entry →



Grey = walls in feet (1½ ft walls carry the shikhar) · Steps sit outside the 25 ft, in front

चित्रમાં · In the drawing	વાસ્તવિક · Realistic
મંડપ 8 × 12 ft, દીવાલ 0	**મંડપ આશરે 10 × 10½ ft**

Illustrative depth budget, not a construction drawing · Wall sizes to be set by the engineer

06 · બે રસ્તા · TWO PATHS

બે રસ્તા, એક પવિત્ર ઓળખ

Two paths, one sacred identity

PATH A · સાચવણી પહેલાં

જીર્ણોદ્ધાર અને મજબૂતી

Restore and strengthen

મજબૂત જૂનો ભાગ રાખીએ, મંડપ અને પ્રવેશ સુધારીએ.
Keep the sound old structure; improve mandap, entry and finishes.

ત્યારે જ, જ્યારે માળખાકીય રિપોર્ટ ટેકો આપે.
Only if the structural report supports it.

PATH B · પુરાવા સાથે જ

જવાબદાર પુનઃનિર્માણ

Rebuild responsibly

સુધારેલી ડિઝાઇનથી નવું મંદિર; પવિત્ર વસ્તુઓ સાચવીને.
A new temple to the corrected design, keeping sacred objects safe.

ત્યારે જ, જ્યારે ટેકનિકલ અને સમાજનું કારણ મજબૂત હોય.
Only with a strong technical and community case.

> **નિર્ણય રિપોર્ટ કરશે, ચિત્ર નહીં.** The engineer's report decides, not a picture.

Both paths keep worship continuous, under the priest's guidance

માતાજી પાછળ, ગરબા ચોક આગળ

Mataji at the quiet back, the garba chowk in front



પવિત્ર કેન્દ્ર · Sacred core

મંદિર, 5 ft પ્રદક્ષિણા, ગૌમુખ

Temple, 5 ft parikrama path, abhishek outlet

સમાજ માટે · For the Samaj

નવરાત્રિ માટે ખુલ્લો ચોક, માંડવી, હવન કુંડ, લીમડા નીચે બાંકડા

Open chowk for Navratri, mandvi, havan kund, benches under neem trees

પ્રવેશ અને સુવિધા · Arrival

દરવાજા પાસે જૂતાં, હાથ ધોવા, પીવાનું પાણી

Shoes, handwash and drinking water at the gate

શૌચાલય વૈકલ્પિક, દૂરના ખૂણે; માતાજી પાસે ક્યારેય નહીં.

Toilet optional, far corner; never beside Mataji.

Sequence of spaces, not to scale · Plot size, boundaries and facing direction to be confirmed by survey and priest

SHRI BHAGWATI MATAJI MANDIR

Gulal, Gujarat | Concept only - subject to survey & approvals



08 · કલ્પના · ONE POSSIBLE LOOK

આવતીકાલનું મંદિર

Tomorrow's temple: a picture to dream with, not to build from

ઊંચાઇ, ઢાળ અને સુવિધાઓ માપણી પછી નક્કી થશે. Height, ramp and facilities follow the survey.

09 · પગલાં · STEP BY STEP

પરિવારના વિચારથી સાચા મંદિર સુધી

From a family idea to a real temple, in five gated steps

01
સાંભળવું
Listen
પૂજારી, વડીલો, ટ્રસ્ટી; ફોટા અને જૂના રેકોર્ડ
Weeks 1–3

02
માપણી
Measure
જમીન, માળખું, માટી ચકાસણી
Weeks 2–6

03
ડિઝાઇન
Design
સોમપુરા અને એન્જિનિયર: બે વિકલ્પ, BOQ
Weeks 6–12+

04
નિર્ણય
Decide
મંજૂરી, ત્રણ ટેન્ડર, પૂરું ભંડોળ
After design

05
બાંધકામ
Build
ચોમાસા પછી શરૂ; તબક્કાવાર ચુકવણી
Per contract

દરેક પગલે સહી કરેલી મંજૂરી, પછી જ આગળ. Each step needs written sign-off before the next.

Decision gates, not promised dates · Monsoon (June–Sept) affects foundation work

બે અલગ ખાતાં, મંદિર પહેલું

Two separate budgets, the temple first

POT A

મંદિરનું મુખ્ય કામ
Temple core

પાયો, માળખું, શિખર, ગર્ભગૃહ, મંડપ, સલામત પ્રવેશ, પાણી નિકાલ, વીજળી
Foundation, structure, shikhar, sanctum, mandap, safe access, drainage, electrical

તોડકામ પહેલાં પૂરું ભંડોળ · Fully funded before any demolition

POT B

આસપાસ અને સુવિધા
Site and comfort

ચોક, દીવાલ, દરવાજો, બાંકડા, પાણી, લાઇટ, પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા
Chowk paving, wall, gate, benches, water, lights, pran pratishtha

દાતાઓની સેવા તરીકે · Can follow as named donor seva

~₹2 lakh

આજે ફક્ત અભ્યાસનો અંદાજ; લેખિત ફી ઓફર પછી નક્કી.
Today only the study allowance, a discussion figure to be fixed by written fee proposals.

No contractor-validated total exists yet · Three itemised bids on one shared BOQ before any build budget

સમાજની જવાબદારી

Trust in the process matters as much as the design

કામ · Task	શું કરવું · What it means
માલિકી ચકાસો Confirm ownership	જમીનના કાગળ, ટ્રસ્ટ નોંધણી, કોણ મંજૂરી આપી શકે Land records, trust registration, who can authorise works
નાની સમિતિ Small committee	પૂજા, ડિઝાઇન, હિસાબ અને સ્વતંત્ર ચકાસનાર; મિનિટ્સ જાહેર Ritual, design, finance and an independent checker; publish minutes
દાન સાચી રીતે Donations, correctly	80G અને વિદેશી દાન (FCRA) CA પાસે ચકાસો Confirm 80G and overseas-donation (FCRA) rules with a CA
દાતાનો વિશ્વાસ Donor confidence	તકતી નીતિ પહેલાં નક્કી; દર મહિને હિસાબ Agree the donor-plaque policy first; monthly accounts
કાયમી સંભાળ Lasting care	સફાઇ, વોટરપ્રૂફિંગ, વીજળી માટે વાર્ષિક ફંડ Annual fund for cleaning, waterproofing and electrical upkeep

Do not promise tax-deductible receipts until 80G status is confirmed

12 · આજનો ઠરાવ · TODAY'S DECISION

“સમાજ ફક્ત અભ્યાસ અને ડિઝાઇનને મંજૂરી આપે છે.”

“The Samaj approves only a feasibility and design study.”

હા · Yes, today

માપણી, પૂજારીજીની સલાહ, બે ડિઝાઇન વિકલ્પ

Survey, the priest's guidance, two priced design options

ના · Not today

તોડકામ, મૂર્તિ સ્થળાંતર, બાંધકામ કરાર, અંતિમ બજેટ

Demolition, moving the murti, building contracts, a final budget

જય માતાજી

Next 30 days: temple photos and video, measurements, priest and elders' interview, trust papers
